



PROCEDIMIENTO GENERAL

PG.PTC.04

Gestión de la Planificación Estratégica y Operativa Anual y de su Presupuesto

Código del documento	PG.PTC.04
Título	Gestión de la Planificación Estratégica y Operativa Anual y de su Presupuesto
Tipo	Procedimiento General
Versión	03
Elaboró	Dirección General de Organización e Innovación Administrativa (DGOIA)
Revisó	Dirección Ejecutiva — Ecosistema Tecnológico UNNE
Aprobó	Consejo Directivo del PTC
Fecha de aprobación	[Completar al aprobar]
Vigencia desde	[Completar al aprobar]
Próxima revisión	[A 24 meses de la aprobación]

1. Objeto

Establecer el procedimiento para la formulación, aprobación, seguimiento, revisión y cierre del Plan Estratégico y Operativo Anual y de su respectivo Presupuesto Anual del Parque Tecnológico Corrientes, asegurando que ambos instrumentos se elaboren de manera sistemática, documentada, participativa, coherente y trazable.

2. Alcance

Comprende el diagnóstico institucional, la ratificación o revisión de la misión y visión vigentes, la formulación del Plan Estratégico y Operativo Anual, la definición de objetivos, proyectos, actividades, metas, indicadores, responsables y plazos, la elaboración del Presupuesto Anual, su aprobación, comunicación, seguimiento, revisión y el cierre del ciclo anual.

No comprende la ejecución presupuestaria ni las contrataciones, que se regulan mediante procedimientos específicos. La gestión de los recursos económicos del Parque se rige por el PG.PTC.03 — Gestión de Recursos Económicos del Parque Tecnológico.

3. Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
Plan Estratégico y Operativo Anual	Instrumento de gestión que, tomando como marco la misión y visión institucionales, establece para cada ejercicio las prioridades, objetivos, proyectos, actividades, metas, indicadores, responsables, plazos y recursos necesarios. La misión y la visión se ratifican al inicio de cada ciclo y solo se modifican cuando existan cambios institucionales o contextuales que justifiquen su revisión.



Término	Definición
Presupuesto Anual	Expresión económico-financiera de los recursos, ingresos y egresos previstos para ejecutar el Plan Estratégico y Operativo Anual durante el ejercicio.
Proyecto Estratégico	Conjunto coordinado de actividades orientadas al logro de un objetivo del Plan Estratégico y Operativo Anual.
Indicador	Variable definida para medir resultados.
Diagnóstico Institucional	Análisis del contexto interno y externo del PTC que sustenta la definición de prioridades estratégicas.
Prioridades Estratégicas	Líneas de acción que el Consejo Directivo determina como orientadoras del Plan Estratégico y Operativo Anual.
Cierre del Ciclo Anual	Instancia formal en la que se consolidan los resultados del ejercicio y se habilita el inicio del ciclo siguiente.
Riesgo	Efecto de la incertidumbre que puede afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos del proceso.
Oportunidad	Circunstancia que, de aprovecharse, favorece el cumplimiento o la mejora del proceso.
PTC	Parque Tecnológico Corrientes.
DEET-UNNE	Dirección Ejecutiva del Ecosistema Tecnológico de la UNNE.
CD	Consejo Directivo del PTC.
RG	Registro asociado al procedimiento.

4. Marco normativo y documentos de referencia

- Resolución 2903/23-R – Guía para la elaboración de procedimientos administrativos de la UNNE.
- Convenio Específico de Creación del Parque Tecnológico Corrientes.
- Anexo II – Reglamento Interno del PTC.
- Normativa contable, presupuestaria y administrativa vigente de la UNNE.
- PG.PTC.01 – Control de documentos y registros.
- PG.PTC.03 – Gestión de Recursos Económicos del Parque Tecnológico.
- Norma ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de la calidad.

5. Responsabilidades

Área / Responsable	Intervención principal
Dirección Ejecutiva – Ecosistema Tecnológico UNNE	Coordina el proceso de planificación estratégica y presupuestaria; realiza el diagnóstico institucional; formula el Plan Estratégico y Operativo Anual; efectúa el seguimiento trimestral y emite el informe anual.
Gerencia del PTC	Formula propuestas operativas y participa en la elaboración de proyectos e indicadores.



Área / Responsable	Intervención principal
Consejo Directivo del PTC	Define las prioridades estratégicas; aprueba el Plan Estratégico y Operativo Anual, el Presupuesto Anual y sus modificaciones; evalúa resultados y propone ajustes.
Área Administrativa y Financiera	Participa en la formulación del Plan Estratégico y Operativo Anual mediante el análisis de la factibilidad económico-financiera de los objetivos y proyectos propuestos, identifica y evalúa las fuentes de financiamiento, elabora y consolida el anteproyecto de Presupuesto Anual y comunica el Plan Estratégico y Operativo Anual y el Presupuesto Anual aprobados.
Responsables de procesos / áreas	Presentan proyectos, necesidades, metas e indicadores en los plazos establecidos.

6. Riesgos y oportunidades

En línea con el enfoque basado en riesgos de la norma ISO 9001:2015 (cláusula 6.1), se identifican los siguientes riesgos y oportunidades asociados al proceso:

Tipo	Descripción	Tratamiento
Riesgo	No aprobación del Plan y/o del Presupuesto por el Consejo Directivo (Paso 10).	Devolución de observaciones fundadas y reformulación en un plazo máximo de 10 días hábiles (ver Punto 7, Nota 2).
Riesgo	Desvíos significativos entre las metas físicas o presupuestarias acumuladas previstas y los resultados efectivamente alcanzados.	Seguimiento trimestral (Paso 12) con alerta temprana ante variaciones absolutas superiores al 10 % respecto de la meta física o presupuestaria acumulada prevista para el período evaluado.
Riesgo	Falta de alineación entre los proyectos propuestos por las áreas y las prioridades estratégicas definidas.	Instancia de verificación de consistencia previa a la aprobación (Pasos 7 a 9).
Riesgo	Demoras de las áreas en la presentación de propuestas.	Cronograma con plazos definidos (RG.PTC.04.07) y recordatorios formales por parte de la Dirección Ejecutiva.
Oportunidad	Uso de los resultados del informe anual como insumo de mejora continua.	Incorporación del Informe Anual (Paso 15) como entrada del diagnóstico institucional del ciclo siguiente (Paso 4).

7. Desarrollo del procedimiento

N°	Actividad	Responsable	Plazo	Registro
1	Inicia el proceso anual de planificación.	Dirección Ejecutiva	90 días hábiles antes del cierre del ejercicio	RG.PTC.04.07
2	Solicita propuestas a las áreas.	Dirección Ejecutiva	Dentro de los 5 días hábiles del inicio	RG.PTC.04.01
3	Las áreas elaboran propuestas de proyectos y actividades, identifican	Responsables de procesos	15 días hábiles desde la solicitud	RG.PTC.04.01



N°	Actividad	Responsable	Plazo	Registro
	necesidades, responsables, metas e indicadores.			
4	Realiza diagnóstico institucional y análisis del contexto.	Dirección Ejecutiva	15 días hábiles, en paralelo al Paso 3	RG.PTC.04.09
5	Define prioridades estratégicas.	Consejo Directivo	10 días hábiles desde recibido el diagnóstico	RG.PTC.04.08
6	Formula el proyecto de Plan Estratégico y Operativo Anual, tomando como marco la misión y visión institucionales vigentes y las prioridades estratégicas definidas por el Consejo Directivo.	Dirección Ejecutiva	15 días hábiles	RG.PTC.04.02
7	Analiza la factibilidad económico-financiera de los objetivos, proyectos y acciones incluidos en el proyecto de Plan Estratégico y Operativo Anual, identifica las fuentes de financiamiento previstas y formula las observaciones o recomendaciones que correspondan	Área Adm. y Financiera	5 días hábiles desde la recepción del proyecto de Plan Estratégico y Operativo Anual	RG.PTC.04.10
8	Elabora el anteproyecto de Presupuesto Anual considerando el Plan Estratégico y Operativo Anual y el análisis económico-financiero realizado.	Área Adm. y Financiera	15 días hábiles desde la finalización del análisis económico-financiero del Paso 7	RG.PTC.04.03
9	Valida la correspondencia final entre los objetivos, proyectos, actividades y metas del Plan Estratégico y Operativo Anual y las previsiones contenidas en el anteproyecto de Presupuesto Anual.	Dirección Ejecutiva	5 días hábiles	RG.PTC.04.10
10	Aprueba el Plan y el Presupuesto.	Consejo Directivo	En la sesión ordinaria siguiente	Resolución (Nota 1)
11	Comunica el Plan Estratégico y Operativo Anual y el Presupuesto Anual aprobados a las áreas y responsables involucrados.	Área Adm. y Financiera	5 días hábiles desde la aprobación	RG.PTC.04.11
12	Realiza seguimiento trimestral.	Dirección Ejecutiva	10 días hábiles desde el cierre de cada trimestre	RG.PTC.04.04
13	Evalúa resultados y propone ajustes.	Consejo Directivo	En la sesión posterior al informe trimestral	RG.PTC.04.05
14	Aprueba, cuando corresponda, las modificaciones al Plan y/o al Presupuesto que impliquen cambios en los objetivos, metas, proyectos, montos totales o fuentes de financiamiento.	Consejo Directivo	En la misma sesión del Paso 13 o en sesión extraordinaria convocada al efecto	Resolución (Nota 1)
15	Emite informe anual y cierre.	Dirección Ejecutiva	30 días hábiles desde el cierre del ejercicio	RG.PTC.04.06



Nota 1: las Resoluciones del Consejo Directivo constituyen el instrumento formal de aprobación institucional, normado en el Reglamento Interno del PTC y en el PG.PTC.01; no requieren codificación específica en el presente procedimiento.

Nota 2 (manejo de excepciones): en caso de no aprobación en el Paso 10, el Consejo Directivo devolverá las actuaciones con observaciones fundadas. La Dirección Ejecutiva y/o el Área Administrativa y Financiera, según la materia observada, reformularán el Plan y/o el Presupuesto en un plazo máximo de 10 días hábiles. Cumplida la reformulación, se repetirán las instancias de análisis, validación y elevación que correspondan desde los Pasos 6, 7, 8 o 9, según el alcance de las observaciones.

Nota 3 (presentaciones fuera de plazo): vencido el plazo del Paso 3, la Dirección Ejecutiva dejará constancia del incumplimiento y continuará el proceso con la información disponible. Las propuestas extemporáneas solo podrán incorporarse si no afectan el cronograma ni la consistencia del Plan y del Presupuesto, mediante decisión fundada de la Dirección Ejecutiva.

8. Puntos de control

Punto de control	Finalidad	Vinculado a
Control del diagnóstico institucional	Asegura que el Plan Estratégico y Operativo Anual se sustente en un análisis documentado del contexto interno y externo del PTC.	Paso 4
Control de alineación entre propuestas y prioridades estratégicas	Verifica que los proyectos propuestos por las áreas respondan a las prioridades definidas por el Consejo Directivo.	Pasos 5 y 6
Control de consistencia financiera entre Plan y Presupuesto	Garantiza que los objetivos y proyectos del Plan cuenten con respaldo presupuestario suficiente y coherente.	Paso 9
Control de aprobación formal	Garantiza la aprobación del Plan y del Presupuesto por la autoridad competente antes de su ejecución.	Paso 10
Control de seguimiento de indicadores	Permite detectar desvíos respecto de metas e indicadores y activar acciones correctivas oportunas.	Paso 12
Control de revisión y cierre anual	Asegura la evaluación de resultados, la aprobación formal de ajustes y el cierre documentado del ciclo.	Pasos 13 a 15

9. Registros

Los registros asociados al presente procedimiento son los siguientes:

Los datos de ingresos, egresos y ejecución presupuestaria utilizados en el seguimiento se obtendrán de los registros generados conforme al PG.PTC.03 – Gestión de Recursos Económicos del Parque Tecnológico.

Código	Denominación
RG.PTC.04.01	Propuestas Estratégicas
RG.PTC.04.02	Plan Estratégico y Operativo Anual
RG.PTC.04.03	Presupuesto Anual



Código	Denominación
RG.PTC.04.04	Seguimiento Trimestral
RG.PTC.04.05	Revisión Estratégica
RG.PTC.04.06	Informe Anual
RG.PTC.04.07	Cronograma de Planificación
RG.PTC.04.08	Acta de Prioridades Estratégicas
RG.PTC.04.09	Informe de Diagnóstico Institucional
RG.PTC.04.10	Informe de Consistencia Presupuestaria
RG.PTC.04.11	Comunicación del Plan y del Presupuesto Aprobados

Las Resoluciones de aprobación del Plan, del Presupuesto y de sus modificaciones (Pasos 10 y 14) se rigen por el formato institucional general y no forman parte de esta codificación (ver Punto 7, Nota 1).

Los modelos de los registros se desarrollan en el Anexo I del presente procedimiento.




10. Indicadores


Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Responsable
Objetivos cumplidos	(Objetivos alcanzados / Objetivos planificados) x 100	≥ 80%	Anual	Dirección Ejecutiva
Proyectos ejecutados	(Proyectos finalizados / Proyectos planificados) x 100	≥ 80%	Anual	Dirección Ejecutiva
Ejecución presupuestaria	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado) x 100	Entre 90 % y 100 %, analizado conjuntamente con el grado de cumplimiento o físico de las actividades y proyectos	Trimestral	Área Adm. y Financiera
Ejecución de ingresos	(Ingresos percibidos / Ingresos proyectados) x 100	≥ 90%	Trimestral	Área Adm. y Financiera
Cumplimiento de indicadores	(Indicadores en meta / Indicadores totales) x 100	≥ 75%	Anual	Dirección Ejecutiva

Para cada indicador, los registros RG.PTC.04.04 y RG.PTC.04.06 deberán identificar la fuente de información, el período de corte, el responsable de la medición, el resultado obtenido, su interpretación y, cuando corresponda, la acción prevista ante incumplimientos o desvíos.

11. Diagrama del procedimiento

Se representa a continuación la secuencia general del procedimiento, que refleja el orden de la tabla del Punto 7. El cursograma formal, con carriles por responsable y el punto de decisión del Paso 10, deberá incorporarse como Anexo II antes de la aprobación definitiva del presente documento.

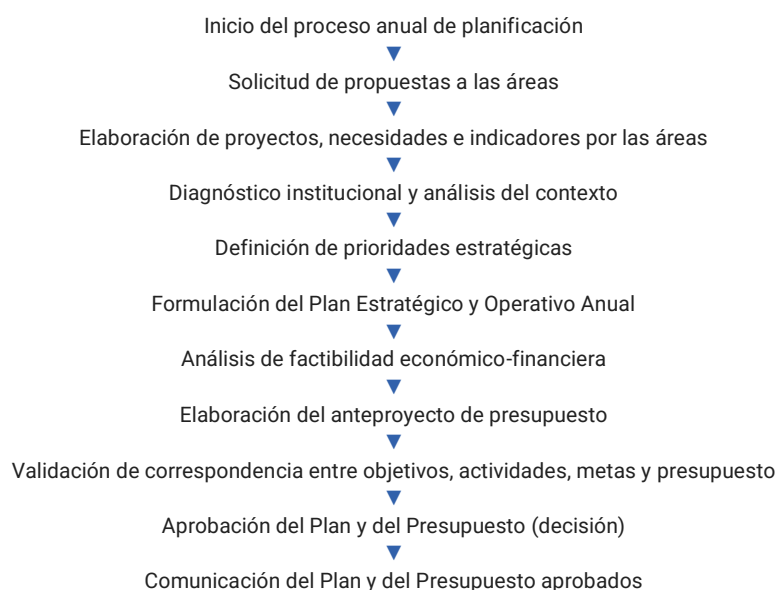





12. Anexos

- Anexo I – Modelos de registros (RG.PTC.04.01 a RG.PTC.04.11).

Los modelos de registros se incluyen a continuación con su estructura de campos.

Anexo I – Modelos de registros

RG.PTC.04.01 – Propuestas Estratégicas

Área	Proyecto / acción propuesta	Objetivo al que contribuye	Indicador	Meta	Recursos estimados	Responsable	Observaciones

RG.PTC.04.02 – Plan Estratégico y Operativo Anual

Ejercicio	
Misión institucional vigente	
Visión institucional vigente	
Prioridades estratégicas de referencia (RG.PTC.04.08)	
Resolución de aprobación	
Fecha de aprobación	
Ratificación o revisión de misión y visión (indicar fundamento si se modifican)	

Objetivo anual	Proyecto / actividad	Indicador	Meta	Plazo	Responsable

RG.PTC.04.03 – Presupuesto Anual

Ejercicio	
Elaboró	
Fecha de elaboración	

Ingresos – Concepto	Fuente	Monto proyectado	Observaciones



Egresos – Concepto	Proyecto / objetivo asociado	Monto estimado	Observaciones

Resultado (ingresos - egresos)	
Observaciones generales	

RG.PTC.04.04 – Seguimiento Trimestral

Trimestre / período	
Fecha de elaboración	
Responsable	

Indicador	Meta	Valor alcanzado	Desvío	Causa del desvío	Acción propuesta

Ejecución presupuestaria del período (% ejecutado / aprobado)	
Ejecución de ingresos del período (% percibido / proyectado)	
Observaciones	

RG.PTC.04.05 – Revisión Estratégica

Fecha de sesión del Consejo Directivo	
Período evaluado	
Informe de referencia (RG.PTC.04.04)	
Resultados analizados	
Ajustes propuestos	
Decisión del Consejo Directivo	
Resolución vinculada (si corresponde)	
Observaciones	

RG.PTC.04.06 – Informe Anual



Ejercicio	
Cumplimiento de objetivos (síntesis)	
Resultados de indicadores	
Ejecución presupuestaria anual	
Proyectos finalizados / en curso / no iniciados	
Desvíos relevantes y causas	
Lecciones aprendidas y recomendaciones para el ciclo siguiente	
Elaboró	
Fecha	

RG.PTC.04.07 – Cronograma de Planificación

Paso	Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha límite	Estado	Observ.

RG.PTC.04.08 – Acta de Prioridades Estratégicas

Fecha de sesión	
Participantes	
Insumos considerados (diagnóstico institucional, informe anual previo)	

N°	Prioridad estratégica	Fundamento

RG.PTC.04.09 – Informe de Diagnóstico Institucional

Fecha	
Período analizado	
Fortalezas	
Debilidades	
Oportunidades	
Amenazas	



Insumos utilizados (informe anual previo, información de las áreas, contexto)	
Conclusiones y prioridades sugeridas	
Elaboró	

RG.PTC.04.10 – Informe de Consistencia Presupuestaria

Fecha:	
Período / Ejercicio:	
Plan Estratégico y Operativo Anual de referencia:	
Área interviniente:	Área de Administración y Finanzas
Elaboró:	

1. Análisis de factibilidad económico-financiera

El Área de Administración y Finanzas analiza la factibilidad económico-financiera de los objetivos, proyectos y acciones incluidos en el proyecto de Plan Estratégico y Operativo Anual, identifica las fuentes de financiamiento previstas y formula las observaciones o recomendaciones que correspondan.

Objetivo Estratégico	Proyecto / Acción	Recursos estimados	Fuente de financiamiento prevista	Monto estimado	¿Factible? (Sí/No)	Observaciones

2. Síntesis del análisis económico-financiero

- ☐ Los objetivos y proyectos propuestos cuentan con una estimación razonable de recursos.
- ☐ Se encuentran identificadas las fuentes de financiamiento previstas.
- ☐ Se identifican proyectos condicionados a la obtención de financiamiento externo.
- ☐ Se requieren ajustes de monto, alcance o fuente de financiamiento antes de elaborar el anteproyecto de presupuesto.
- ☐ No se formulan observaciones.

Conclusión del Área de Administración y Finanzas:

3. Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Anual

Sobre la base del proyecto de Plan Estratégico y Operativo Anual y del análisis económico-financiero precedente, el Área de Administración y Finanzas elabora el anteproyecto de Presupuesto Anual (RG.PTC.04.03).

Fecha de elaboración del anteproyecto:	
Responsable	



4. Validación final de correspondencia Plan Estratégico y Operativo Anual – Presupuesto

Una vez elaborado el anteproyecto de Presupuesto Anual, la Dirección Ejecutiva verifica que los objetivos, proyectos, actividades y metas previstos en el Plan Estratégico y Operativo Anual encuentren adecuada correspondencia con las previsiones presupuestarias antes de su elevación al Consejo Directivo.

Objetivo / Proyecto	Presupuesto previsto	¿Correspondencia? (Sí/No)	Observaciones	Ajuste requerido

Resultado de la validación final:

- ☐ CONSISTENTE
☐ CONSISTENTE CON OBSERVACIONES
☐ REQUIERE REFORMULACIÓN

Observaciones generales:

5. Acciones requeridas

Acción / ajuste requerido	Responsable	Plazo

Dirección Ejecutiva — Responsable de la validación:	
Fecha:	
Firma:	

RG.PTC.04.11 — Comunicación del Plan y del Presupuesto Aprobados

Fecha	
Resolución de referencia	
Destinatarios	
Contenido comunicado (Plan y Presupuesto)	
Medio de comunicación	
Responsable	
Constancia de recepción / difusión	
Observaciones	



13. Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
01	[Completar]	Versión inicial del procedimiento.	DGOIA / DEET-UNNE
02	[Completar]	Incorpora: sección de riesgos y oportunidades (ISO 9001:2015, cláusula 6.1); columna de plazos y nota de manejo de excepciones en el desarrollo del procedimiento; codificación de registros previamente sin código (RG.PTC.04.07 a RG.PTC.04.11); vinculación explícita de los puntos de control con las actividades; fichas técnicas de indicadores (fórmula, meta, frecuencia, responsable); alineación del diagrama del Punto 11 con la tabla del Punto 7; adecuación al formato institucional (carátula con tabla de control, secciones en tablas, Anexo I con modelos de registros).	DGOIA / DEET-UNNE
03	[Completar]	Adecuación integral al enfoque de Planificación Estratégica y Operativa Anual y su respectivo Presupuesto; corrección de secuencia, plazos, referencias cruzadas, comunicación, tratamiento de desvíos, modificaciones y registros asociados.	DGOIA / DEET-UNNE
